


标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	日	2019年3月25日	2019年4月
								一   二   三   四   五   六   日	一   二   三
1		启动	3 个工作日	2019年3月25日	2019年3月27日				
2		组建核心团队	1 个工作日	2019年3月25日	2019年3月25日				
3		干系人分析	1 个工作日	2019年3月25日	2019年3月25日				
4		里程碑计划	0.5 个工作日	2019年3月26日	2019年3月26日	2, 3			
5		指定项目章程	0.5 个工作日	2019年3月26日	2019年3月26日				
6		项目启动大会	1 个工作日	2019年3月27日	2019年3月27日	4, 5			
7		规划	13 个工作日	2019年3月28日	2019年4月15日				
8		规划范围	6 个工作日	2019年3月28日	2019年4月4日				
9		制定需求分析说明书	1 个工作日	2019年3月28日	2019年3月28日				
10		界面设计	2 个工作日	2019年3月29日	2019年4月1日	9			
11		详细设计说明书	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	10			
12		范围说明书	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日				
13		创建WBS	0.5 个工作日	2019年4月3日	2019年4月3日	12			
14		形成范围基准	0.5 个工作日	2019年4月3日	2019年4月3日				
15		规划时间	1 个工作日	2019年4月4日	2019年4月4日	8			
16		排列工作包顺序	0.25 个工作日	2019年4月4日	2019年4月4日				
17		估算资源	0.25 个工作日	2019年4月4日	2019年4月4日				
18		估算持续时间	0.25 个工作日	2019年4月4日	2019年4月4日				
19		制定进度计划	0.25 个工作日	2019年4月4日	2019年4月4日				
20		规划成本	1 个工作日?	2019年4月5日	2019年4月5日				
21		项目成本估算	0.5 个工作日	2019年4月5日	2019年4月5日				
22		项目预算	0.5 个工作日	2019年4月5日	2019年4月5日				
23		规划质量	2 个工作日	2019年4月8日	2019年4月9日	15, 20			
24		制定测试计划	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日				
25		制定测试用例	1 个工作日	2019年4月9日	2019年4月9日				
26		规划人力资源	1 个工作日?	2019年4月10日	2019年4月10日	23			
27		制定人力资源计划	0.5 个工作日	2019年4月10日	2019年4月10日				
28		制定人员配备管理计划	0.5 个工作日	2019年4月10日	2019年4月10日				
29		规划沟通	1 个工作日?	2019年4月11日	2019年4月11日				
30		制定沟通管理计划	0.5 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日				
31		规划采购	1 个工作日?	2019年4月12日	2019年4月12日	26, 29			
32		自制外购分析	0.5 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日				
33		制定采购文件	0.5 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日				

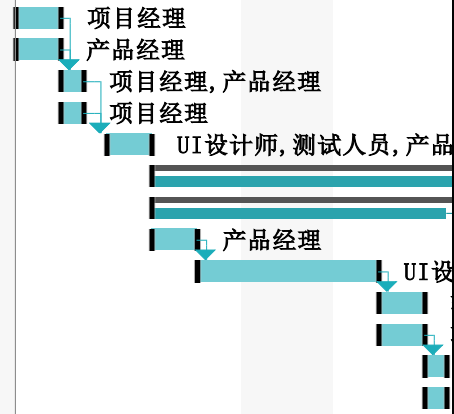

项目：大学生校园appWBS. mpp

日期：2019年6月18日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	日	2019年3月25日	2019年4月
								一 二 三 四 五 六 日	一 二 三
34		规划风险	0.25 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日				
35		识别风险	0.25 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日				
36		风险分析	0.25 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日				
37		制定风险登记册	0.25 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日				
38		规划整合	0.25 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日				
39		执行与监控	15 个工作日	2019年4月16日	2019年5月6日				
40		组建项目团队	1 个工作日	2019年4月16日	2019年4月16日				
41		项目执行	5 个工作日	2019年4月17日	2019年4月23日				
42		用户模块	4 个工作日	2019年4月17日	2019年4月22日				
43		注册登录	1 个工作日	2019年4月17日	2019年4月17日				
44		首页	1 个工作日	2019年4月17日	2019年4月17日				
45		浏览信息	0.5 个工作日	2019年4月18日	2019年4月18日				
46		发布信息	0.5 个工作日	2019年4月18日	2019年4月18日				
47		搜索信息	0.5 个工作日	2019年4月19日	2019年4月19日				
48		个人信息	1 个工作日	2019年4月18日	2019年4月18日				
49		用户交流	0.5 个工作日	2019年4月19日	2019年4月19日				
50		管理员模块	1 个工作日	2019年4月22日	2019年4月22日				
51		身份验证	1 个工作日	2019年4月22日	2019年4月22日				
52		统计分析	0.5 个工作日	2019年4月22日	2019年4月22日				
53		备份	0.5 个工作日	2019年4月22日	2019年4月22日				
54		项目监控	3 个工作日	2019年4月23日	2019年4月25日	41			
55		各项指标监控	1 个工作日	2019年4月23日	2019年4月23日				
56		监控评审	1 个工作日	2019年4月24日	2019年4月24日				
57		变更评审	0.5 个工作日	2019年4月25日	2019年4月25日				
58		例会	0.5 个工作日	2019年4月25日	2019年4月25日				
59		管理干系人	2 个工作日	2019年4月26日	2019年4月29日	54			
60		发布项目信息	0.5 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日				
61		报告监控指标	0.5 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日				
62		干系人沟通	0.5 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日				
63		团队建设	5 个工作日	2019年4月30日	2019年5月6日	59			
64		培训	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日				
65		娱乐活动	1 个工作日	2019年5月1日	2019年5月1日				
66		沟通	0.5 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日				

项目：大学生校园appWBS.mpp

日期：2019年6月18日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间








外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	日	2019年3月25日							2019年4月		
67			采购	0.5 个工作日	2019年5月2日	2019年5月2日			一	二	三	四	五	六	日	一	二	三
68			项目验收	1 个工作日	2019年5月3日	2019年5月3日												
69			收尾	2 个工作日	2019年5月6日	2019年5月7日												
70			项目终验	1 个工作日	2019年5月6日	2019年5月6日												
71			结束采购	1 个工作日	2019年5月6日	2019年5月6日												
72			项目内部收尾	1 个工作日	2019年5月7日	2019年5月7日												

项目：大学生校园appWBS. mpp  
日期：2019年6月18日


任务


拆分


里程碑


摘要


项目摘要












非活动任务


非活动里程碑


非活动摘要

手动任务

仅工期








手动摘要总成


手动摘要


仅开始时间


仅完成时间


外部任务













外部里程碑


最后期限

进度

手动进度





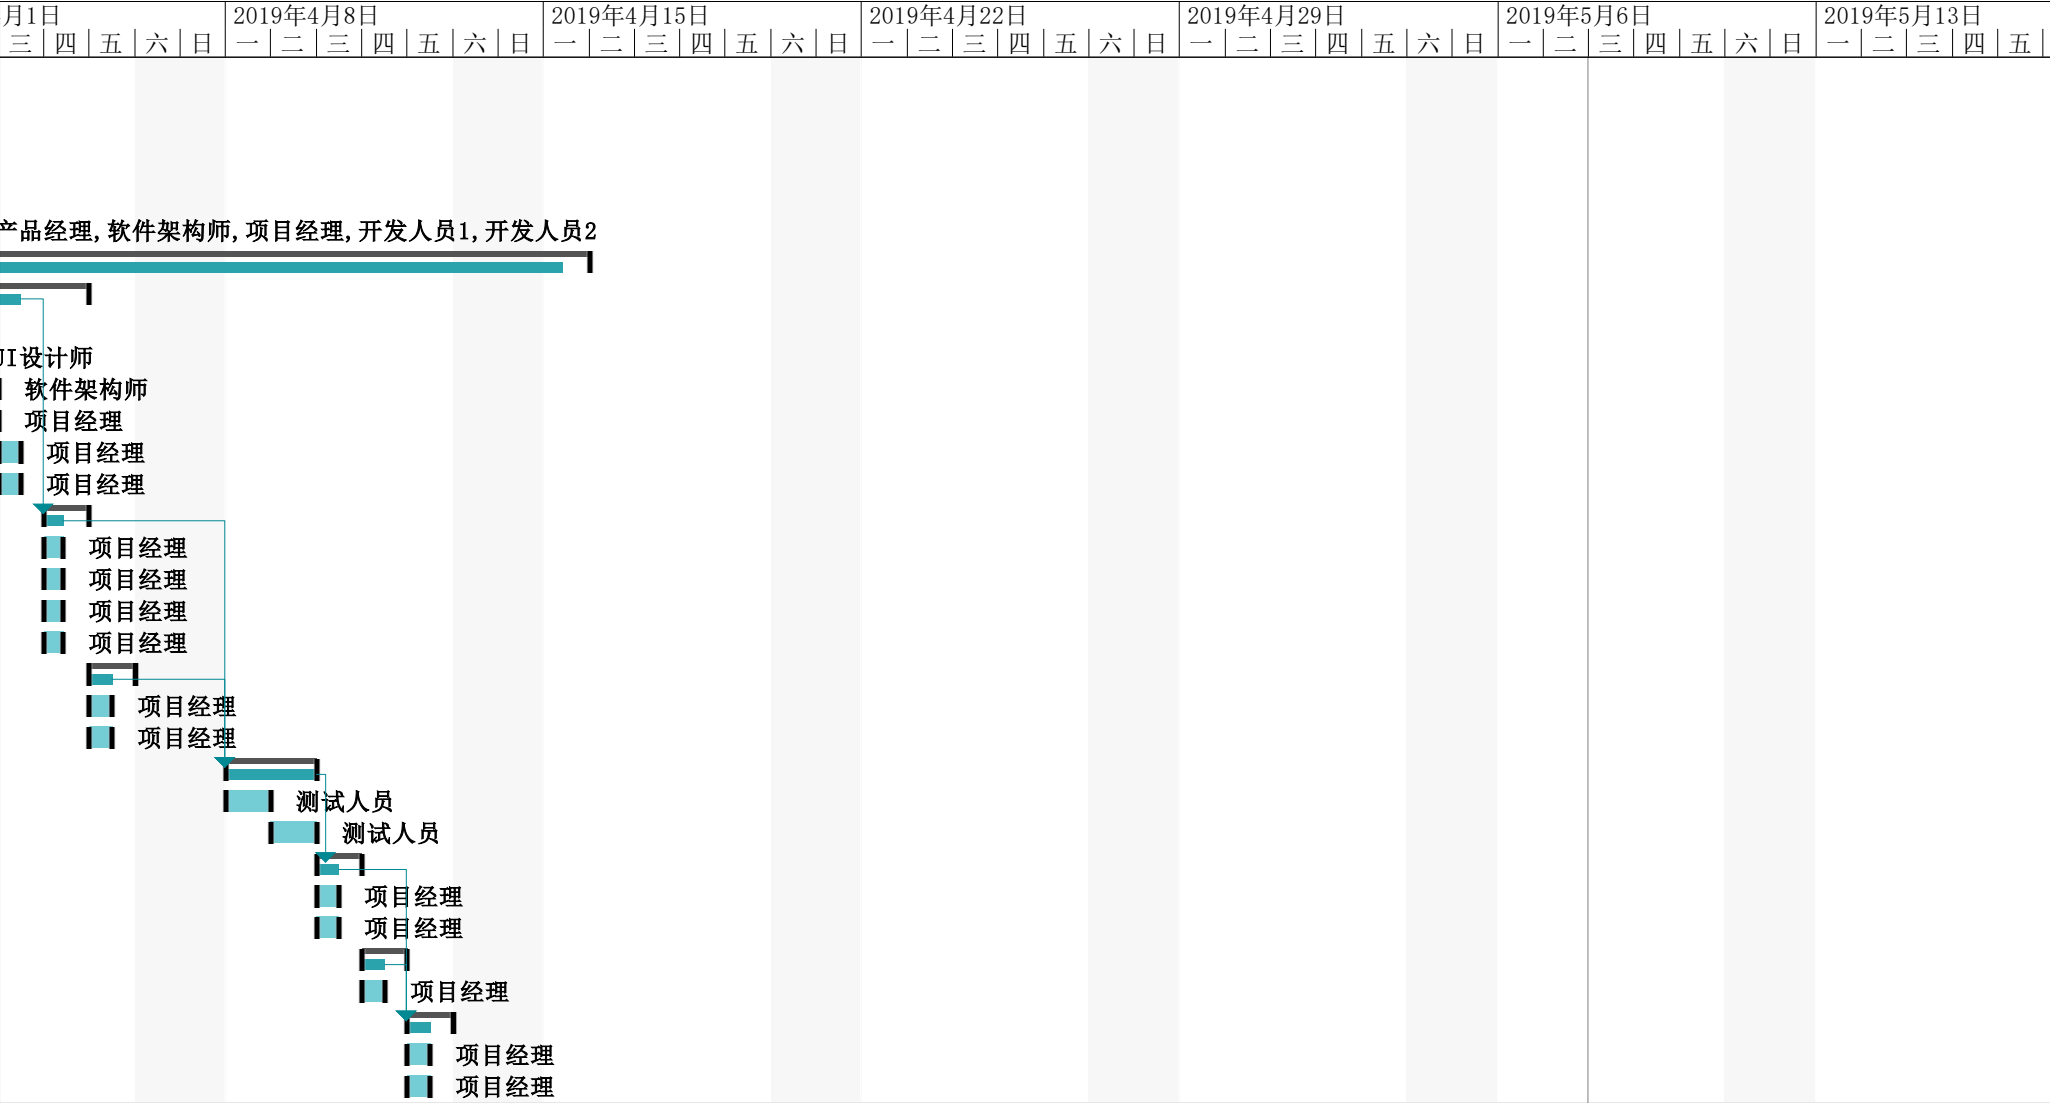

项目：大学生校园appWBS.mpp  
日期：2019年6月18日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

◆

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间


外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

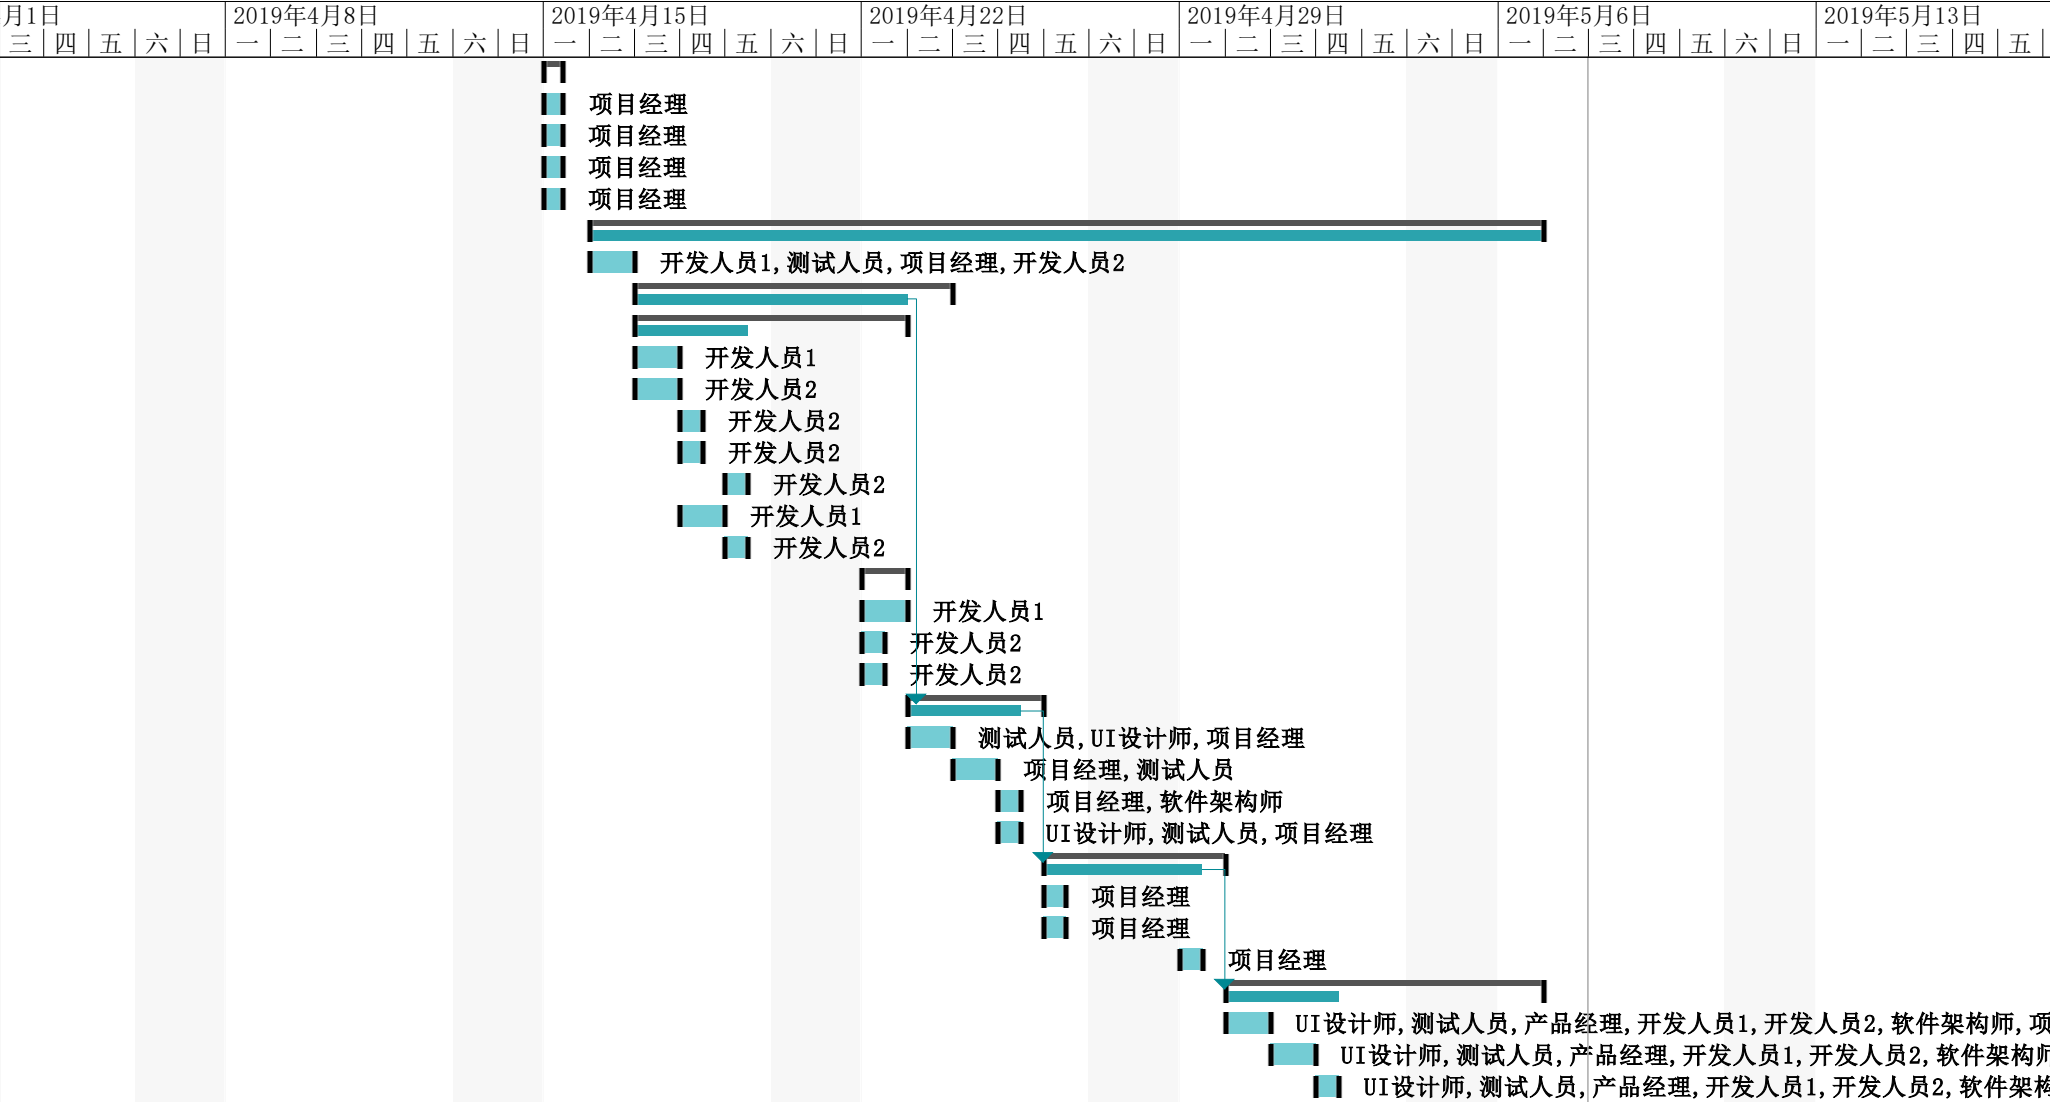

项目：大学生校园appWBS. mpp 日期：2019年6月18日	任务		非活动任务	手动摘要总成		外部里程碑
	拆分		非活动里程碑	手动摘要		最后期限
	里程碑		非活动摘要	仅开始时间		进度
	摘要		手动任务	仅完成时间		手动进度
	项目摘要		仅工期	外部任务		

